تقرير مصور عن تقدم سير العمل بموقع مركز تدريب الدفاع المدنى بمنطقة تبوك المرحلة الثالثة

البدء فى أعمال نجارة القواعد المسلحة لحواجز التدريب بميدان المشبهات

البدء فى أعمال نجارة القواعد المسلحة لحواجز التدريب بميدان المشبهات

اعمال نجارة وحدادة كمرات المستودع

اعمال نجارة وحدادة ارضية المستودع (متوقف بتعليمات الضابط المشرف منذ أكثر من شهرين) وتم
إلغاء صرف المياه السطحية داخل المستودع من الضابط المشرف

العمل متوقف فى السور بناء على تعليمات الضابط المشرف منذ أكثر من شهر رغم التأكد من مطابقة القواعد ورقابى الاعمدة التى تم تكسيرها لجداول التسليح

استلام جهة الاشراف لقواعد ورقابى السور التى تم تكسيرها والتأكد من مطابقتها لجداول التسليح

الانتهاء من كل خرسانات (غرفة المحاضرات + غرفة التحكم + برج المراقبة) بميدان القيادة وجارى البدء فى أعمال التشطيب

الانتهاء من فرد الصب بيس لميدان القيادة بالكامل

الانتهاء من وضع طبقة الصب بيس لكامل الطرق مع الرص حوالى (60,000) ستون الف متر مسطح تمهيداً لاعمال الرش والاسفلت وتم ايقافنا من الضابط المشرف رغم اعتماد التربة المستخدمة من مختبر التربة والاساسات (سفكو) ولم يتم إحتساب أو إضافة كل هذه الأعمال فى المستخلص رقم 4

الانتهاء من تجهيز ارضية ملاعب التنس منذ أكثر من ثلاثة أشهر وعدم السماح لنا بتكملة الاعمال

جارى البدء فى فرد طبقة البيس كورس لملعب كرة القدم

الانتهاء من خرسانات البوابة الجديدة وغرفة الحراسة

جارى البدء فى اعمال تلييس برج التدريب

الانتهاء من اعمال نجارة وحدادة لبشة النافورة بمدخل المركز

الانتهاء من صب رقابى اعمدة منصة الاحتفالات

الانتهاء من اعمال تلييس داخلى وخارجى لمبنى التوقيف

الانتهاء من تلييس الواجهات الخارجية للمبانى تمهيدا لكسر الرخام

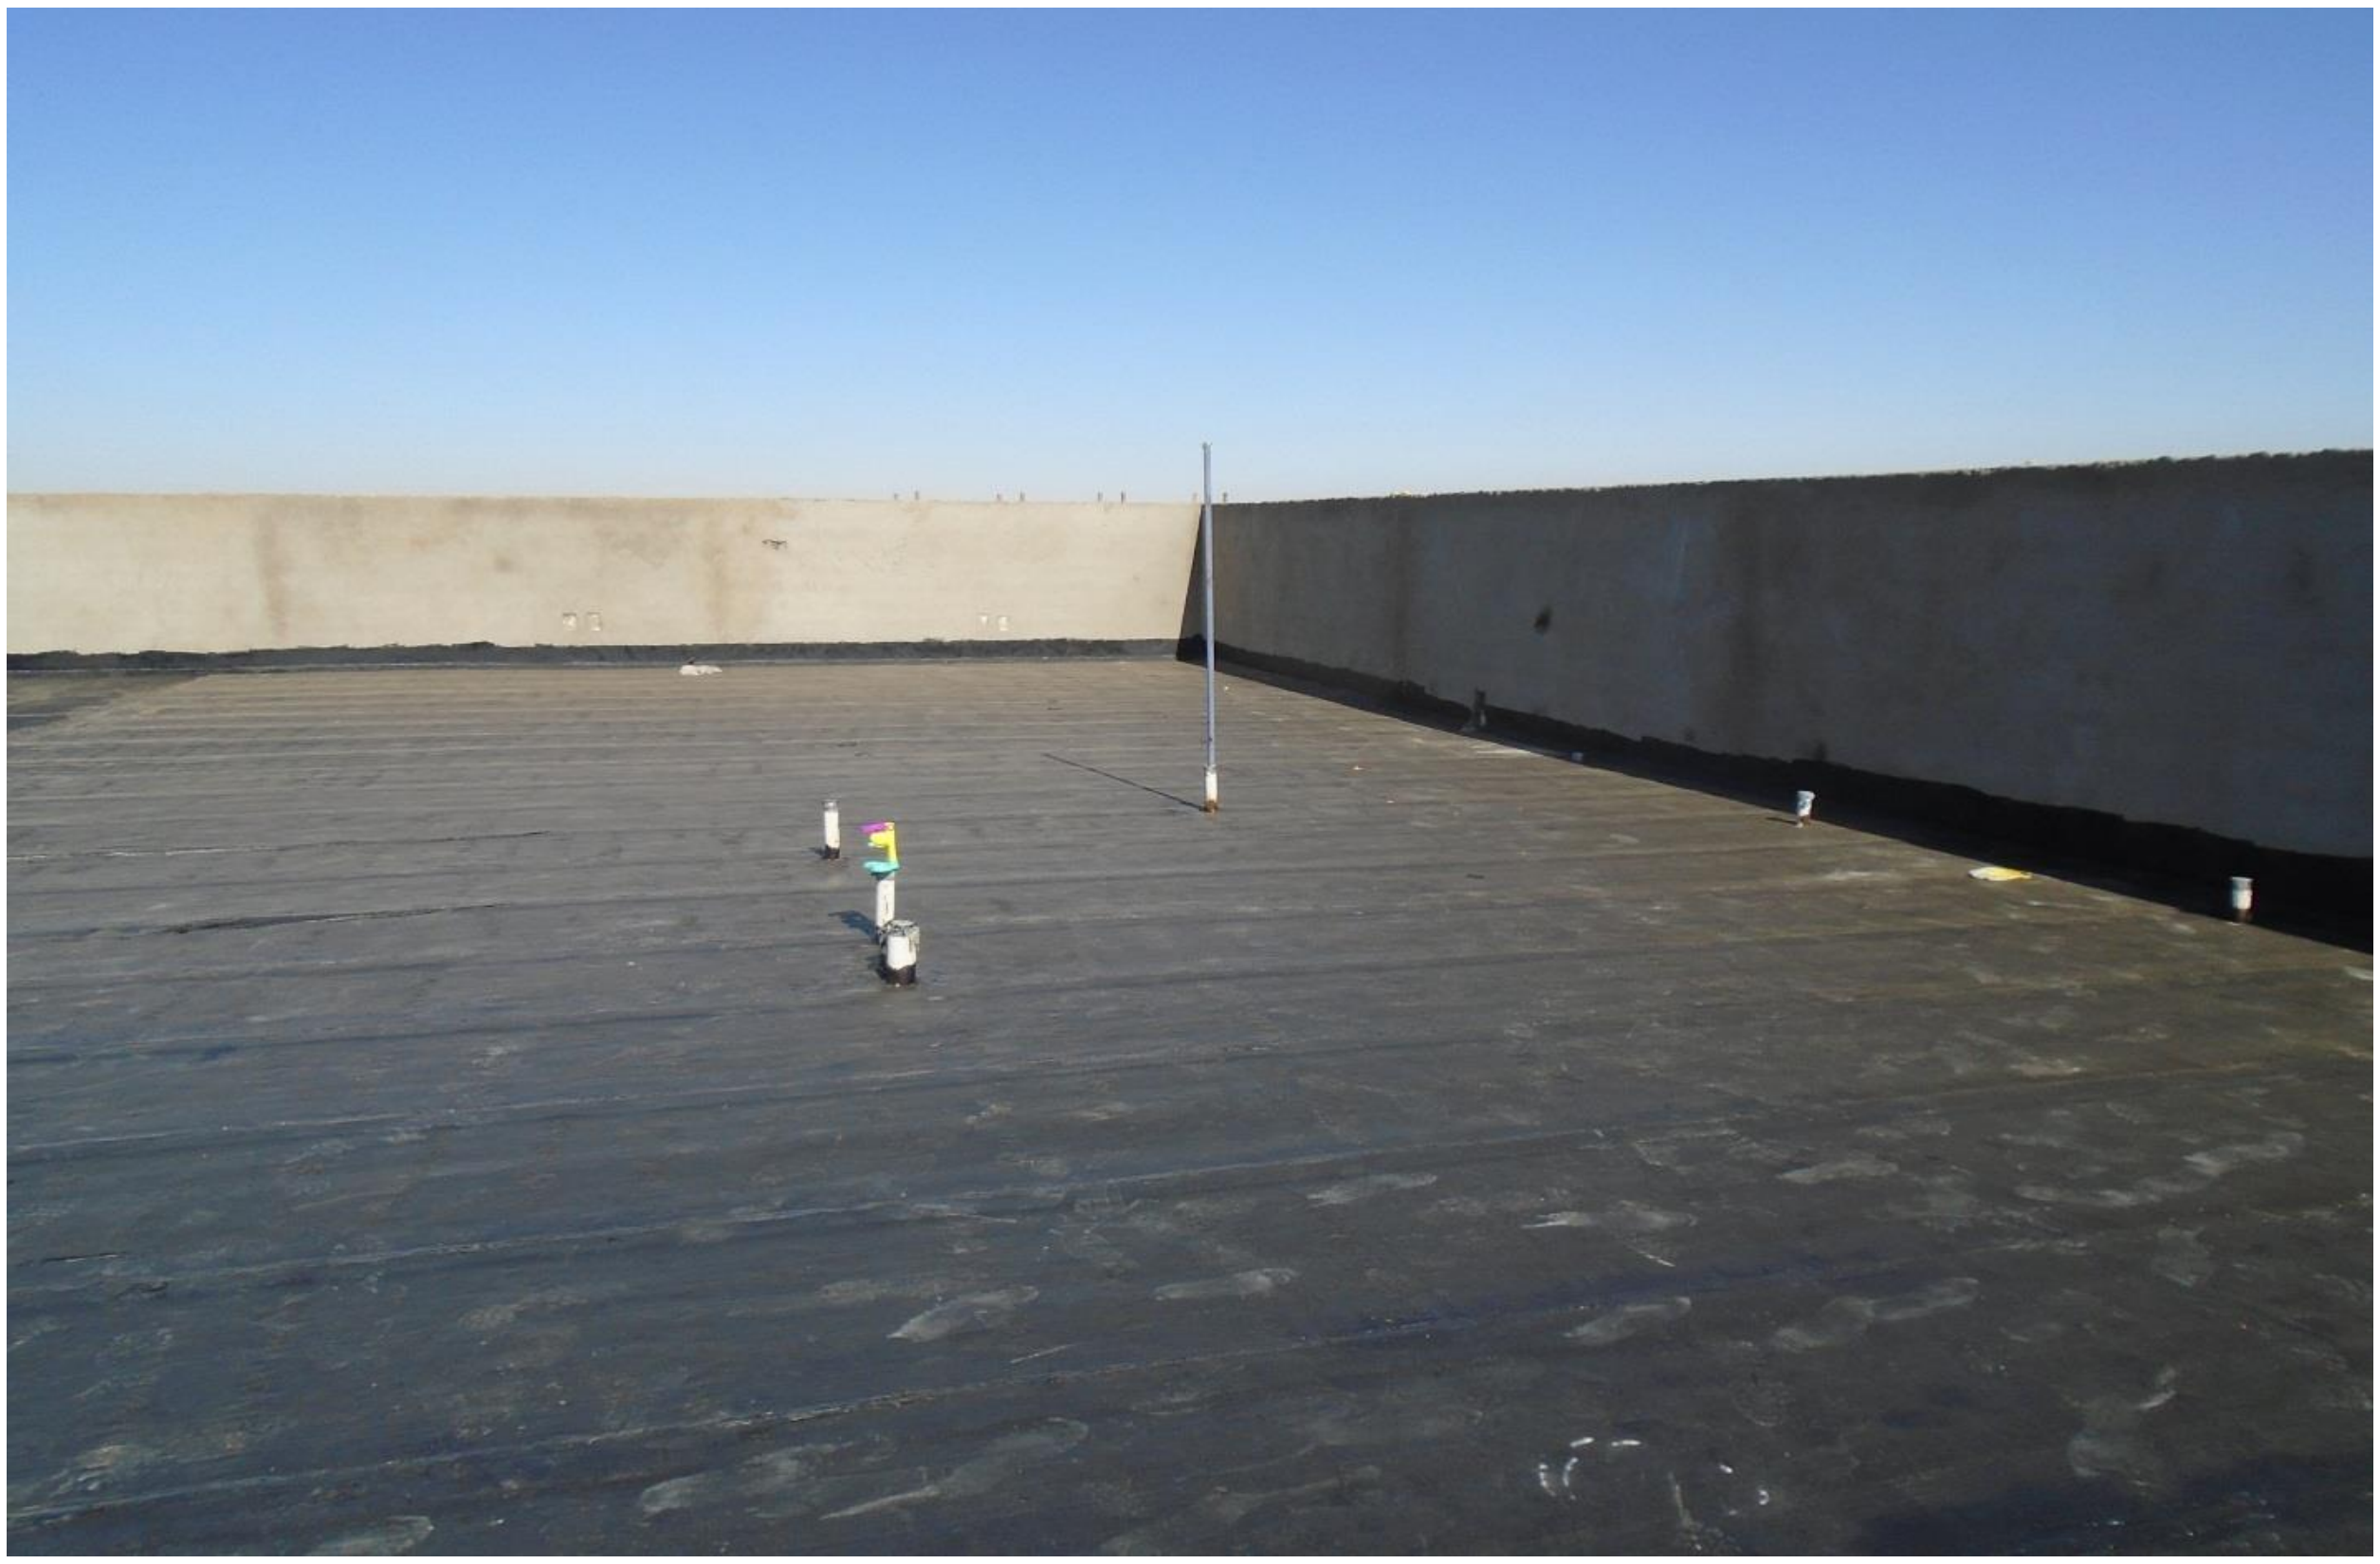

جارى اعمال العزل للاسطح

حفر منصة كرة القدم ووضع طبقة الاحلال منذ اكثر من عشرة اشهر ولم يتم البت فى أمرها حتى تاريخه

الانتهاء من تلييس بوائك الاليات ومتبقى تركيب الهنجر فقط
